

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវការអនុវត្តគម្រោងពាក់កណ្តាល
អាណត្តិ

គម្រោងជំនួយផ្នែកលើលទ្ធផលដឹកនាំដោយស្ត្រី (រ៉ូបា)
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

មូលនិធិទឹកសម្រាប់ស្ត្រី នៃក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្ម អូស្ត្រាលី

របាយការណ៍សង្ខេប

ខែតុលាឆ្នាំ ២០២១



បណ្ឌិតលៀន ផាម (អ្នកដឹកនាំការវាយតម្លៃរបស់អង្គការអ៊ុសមីតេស៊ី)



មាតិកា

បញ្ជីអក្សរកាត់ Error! Bookmark not defined.

១. ការពិពណ៌នា
និងលទ្ធផលនៃគម្រោងជំនួយផ្នែកលើលទ្ធផលដែលដឹកនាំដោយស្ត្រី 3

២. ការពិនិត្យឡើងវិញពាក់កណ្តាលអាណត្តិ 5

២.១. គោលបំណងនៃការវាយតម្លៃ 5

២២. វិធីសាស្ត្រ 5

២១.២. វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃ និងវិធីនានា 5

២២.២. ការមានត្រូវដែនកំណត់ 6

៣ការរកឃើញ និងមេរៀនសំខាន់ៗ 7

៤. អនុសាសន៍ 13

បញ្ជីអក្សរកាត់


CC	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
CCWC	គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារឃុំ (គ.ក.ន.ក)
CDPO	អង្គការជនពិការកម្ពុជា
CHOBA	ជំនួយផ្នែកលើលទ្ធផលអនាម័យសហគមន៍ (គម្រោងរបស់អង្គការអ៊ិសមីតេស៍ស៍ពីមុន)
CIP	ផែនការវិនិយោគឃុំ
CWA	សមាគមទឹកស្អាតកម្ពុជា
DFAT	ក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្ម អូស្ត្រាលី
DORD	ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទស្រុក
DRHC	នាយកដ្ឋានថែទាំសុខភាពជនបទ
DPO	អង្គការជនពិការ
EMW	អង្គការអ៊ិសមីតេស៍ស៍ (លោកខាងលិចជបខាងកើត)
FSM	ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក
GESI	សមភាពយេនឌ័រ និងបរិយាប័ន្នសង្គម
MRD	ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (ក្រសួង អ.ជ.ប)
OBA	ជំនួយផ្នែកលើលទ្ធផល
PDIH	មន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្ត
PDRD	មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត (មន្ទីរ អ.ជ.ប ខេត្ត)
PWD	ជនមានពិការភាព
RSCC	ក្រុមហ៊ុនសម្អាតអនាម័យជនបទ
RWSSH	ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ការសំអាត និងអនាម័យជនបទ
ToC	ទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរ
TOT	ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល
WfW	ទឹកសម្រាប់ស្ត្រី
WOBA	គម្រោងជំនួយផ្នែកលើលទ្ធផលដែលដឹកនាំដោយស្ត្រី

1. ការពិពណ៌នា និងលទ្ធផលនៃគម្រោងជំនួយផ្នែកលើលទ្ធផលដែលដឹកនាំដោយស្ត្រី

ជំនួយផ្នែកលើលទ្ធផលដែលដឹកនាំដោយស្ត្រីនៅកម្ពុជា (វ្លុបា) គឺជាគម្រោងមួយដែលត្រូវបានរៀបចំ និងអនុវត្តដោយ អង្គការអិសមីតេស៊ី (មូលនិធិលោកខាងលិចជប៉ុនខាងកើត)។ គម្រោងមានគោលបំណងសំខាន់ៗ៖ ១) ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅតាមជនបទតាមរយៈការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានសេវាកម្មទឹកស្អាតនិងអនាម័យប្រកបដោយសមធម៌ ជាពិសេសក្នុងចំណោមសមាជិកសហគមន៍ដែលជាគ្រួសារក្រីក្រ និងគ្រួសារក្រីក្រងាយរងគ្រោះ ២) ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការផ្តល់អំណាចយេនឌ័រ និងការរួមបញ្ចូលស្ត្រីតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីនិងការសម្រេចចិត្ត។ វាត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិដោយក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលី (DAFT) តាមរយៈមូលនិធិទឹកសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងរយៈពេល ៤.៥ ឆ្នាំ (ពីខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២២) ដោយមានថវិកាសរុបចំនួន ៣.៣៩៩.៦៣០,៧១ ដុល្លារអូស្ត្រាលី។ គម្រោងវ្លុបានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានសមាសភាគអនុវត្តសំខាន់ៗ៖

- គ្រួសារក្រីក្រ និងគ្រួសារក្រីក្រងាយរងគ្រោះចំនួន ៣.៧៥០ គ្រួសារ ភ្ជាប់ទៅនឹងគម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកតាមប្រព័ន្ធ ១យោ- ការតភ្ជាប់បណ្តាញទឹកទុយោរបស់ពួកគេនិងត្រូវបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានតាមរយៈអន្តរាគមន៍ ឧបត្ថម្ភធនកាទ្រង់គ្រួសារក្រីក្រដោយផ្នែកលើលទ្ធផលប្រកួតប្រជែង។
- ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលទ្ធភាពទទួលបានអនាម័យក្នុងសហគមន៍ជនបទ ដោយសាងសង់បង្គន់អនាម័យសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រចំនួន ១៥.០០០ ខ្នងផ្ទះ និងគ្រួសារមិនមែនក្រីក្រចំនួន ១៥.០០០ ខ្នងផ្ទះ ដែលក្នុងនោះមាន ៤.០០០ ខ្នងផ្ទះជាគ្រួសារក្រីក្រងាយរងគ្រោះ (សមភាពយេនឌ័រ និងបរិយាប័ន្តសង្គម)។

គម្រោងវ្លុបា មានលទ្ធផលរំពឹងទុកចំនួន ៥៖

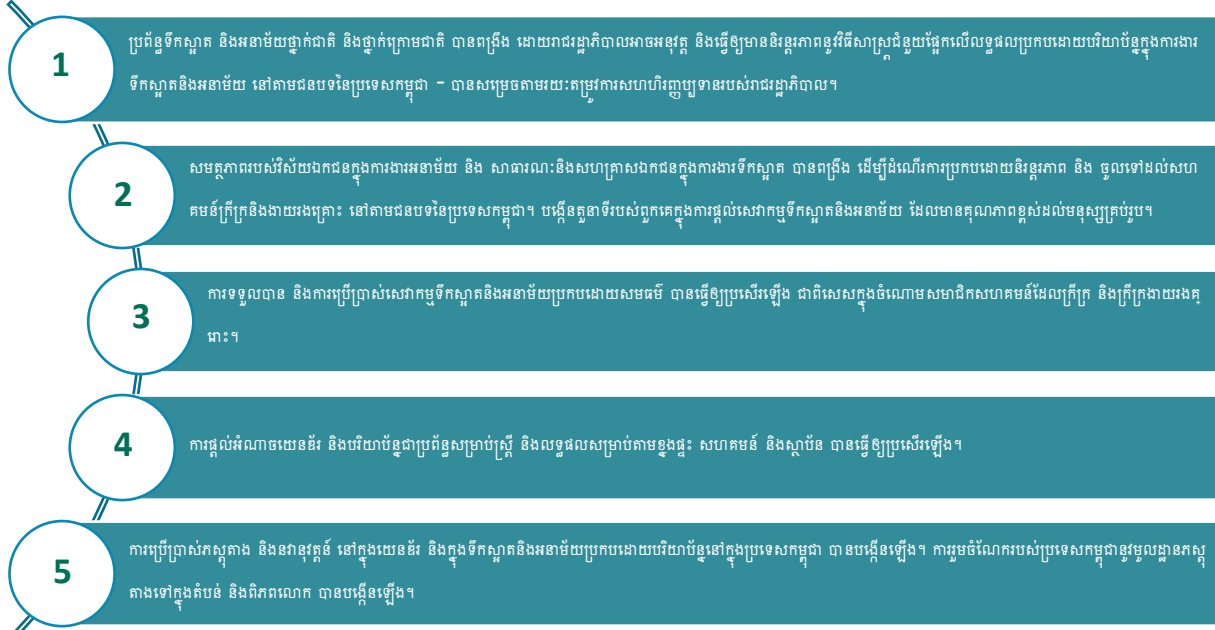

ទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរស្របគ្នាទៅនឹងទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់មូលនិធិទឹកសម្រាប់ស្ត្រី គម្រោងវ្លុបា មានយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន៣ ដែលត្រូវបានរំពឹងថានឹងរួមចំណែកដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលរំពឹងទុកទាំង៥ ខាងលើ។

- បង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយរដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុក និងឃុំ គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារ និងប្រតិបត្តិការ វិស័យឯកជនក្នុងការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យ ដើម្បីពង្រឹងយន្តការសម្របសម្រួល (នៅគ្រប់ ស្ថាប័ន) និងសមត្ថភាពវិស័យឯកជនក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មទឹកស្អាតនិងអនាម័យ សម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រ និង គ្រួសារក្រីក្រងាយរងគ្រោះ។

- កសាងសមត្ថភាពដល់ដៃគូរាជរដ្ឋាភិបាល ស្រីនៅក្នុងជួរគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារ ស្ត្រីនៅតាមភូមិ និងប្រតិបត្តិករវិស័យឯកជនក្នុងការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យ ដើម្បីអនុវត្តសេវាកម្មជំនួយផ្នែកលើលទ្ធផលនៃការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យសម្រាប់គ្រួសារ ក្រីក្រ និងគ្រួសារក្រីក្រងាយរងគ្រោះ។
- បង្កើនភាពជាដៃគូជាមួយដៃគូរាជរដ្ឋាភិបាល អាជ្ញាធរទឹកស្អាតនិងអនាម័យ គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារ និងប្រតិបត្តិករទីក្នុងក្នុងការសម្របសម្រួលសិក្ខាសាលានានាដើម្បីបញ្ជាប និងស្វែងរកមតិកា់ទ្រង់ទ្រាយយេនឌ័រ ពិការភាព និងវិធីសាស្ត្របរិយាប័ន្នសង្គម ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មទឹកស្អាតនិងអនាម័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

គម្រោងនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើវិធានសម្ព័ន្ធភាពជាដៃគូដែលអនុវត្តតាមវិធានសម្ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល (ពិថ្នាក់ជាតិ-ថ្នាក់ក្រោមជាតិ-ភូមិ) អ្នកផ្គត់ផ្គង់អនាម័យវិស័យឯកជន និងសមាគមផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកម្ពុជា (CWA) ដើម្បីគ្រប់គ្រងគម្រោងឧបត្ថម្ភធននៃជំនួយផ្នែកលើលទ្ធផល។ គម្រោងរៀបចំមានគោលបំណងដើម្បីកសាងសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងការដឹកនាំចលនាការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យ តាមរយៈភាពជាដៃគូជាមួយ គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារនៅថ្នាក់ស្រុកនិងឃុំ និងតាមរយៈមេភូមិស្ត្រី និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិ។

លទ្ធផលគម្រោងត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

គិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ គម្រោងរៀបចំបានស្នើរតែ១០០% នៃគោលដៅបង្កនូវអនាម័យ ៩០%នៃគោលដៅវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងអនាម័យពេលមានរដូវសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រី និង១០០% នៃគោលដៅការចែកចំណែកលាងដៃបង្ការកូវីដ-១៩ ។ លទ្ធផល នៃការតភ្ជាប់បណ្តាញទឹក គឺមានភាពយឺតយ៉ាវ និងសម្រេចបានប្រហែល ៣៣% នៃគោលដៅ។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់អនាម័យចំនួន ២៥នាក់ ដែលក្នុងនោះមាន ៥នាក់ជាស្ត្រី និងប្រតិបត្តិករទឹកស្អាតស្ត្រីចំនួន ១១ នាក់ បាននឹងកំពុងចូលរួមក្នុងគម្រោងរៀបចំដើម្បីសាងសង់បង្កនូវអនាម័យ និងតភ្ជាប់បណ្តាញទឹកទុយោដល់គ្រួសារគោលដៅ និងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីទឹកស្អាតនិងអនាម័យ និងសុខភាព។ គម្រោងរៀបចំបាននឹងកំពុងសហការជាមួយអង្គការជនពិការកម្ពុជា (CDPO) ដើម្បីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលលើការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យប្រកបដោយ បរិយាប័ន្ន និងផ្តល់នូវការលើកកម្ពស់អនាម័យនិងសំភារៈលាងសម្អាតដៃដែលជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបនឹង ការបង្ការ កូវីដ-១៩ សម្រាប់អង្គការជនពិការ (DPO) ចំនួន ៤៥ និងជនមានពិការភាពនៅក្នុងក្រុមអង្គការជនពិការរបស់ពួកគេ។


2. ការពិនិត្យឡើងវិញពាក់កណ្តាលអាណត្តិ

2.1. គោលបំណងនៃការវាយតម្លៃ

ការពិនិត្យឡើងវិញពាក់កណ្តាលអាណត្តិ គឺវាយតម្លៃលើវឌ្ឍនភាពរបស់កម្មវិធីក្នុងការឆ្ពោះទៅសម្រេចលទ្ធផលដែលបានក្រោងទុក និងគាំទ្រដល់ការរៀនសូត្រដោយស្វែងយល់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្រ និងសកម្មភាពដែលបានអនុវត្តចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២១។ វាជាការស្វែងយល់ពីការចង្អុលបង្ហាញដំបូងនៃផលប៉ះពាល់ និងនិរន្តរភាព។ វាផ្តល់នូវអនុសាសន៍សំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីដែលកំពុងបន្ត និងវឌ្ឍនភាពក្នុងការឆ្ពោះទៅសម្រេចលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គម្រោង។

ការពិនិត្យឡើងវិញពាក់កណ្តាលអាណត្តិនេះ ក៏មានគោលបំណងជួយកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការវាយតម្លៃរយៈពេលវែងដ៏រឹងមាំនៅចុងបញ្ចប់ នៃគម្រោង។ វាមានបំណងឱ្យដឹងថាការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីប្រសិទ្ធភាព/ប្រសិទ្ធផលនៃវិធីសាស្ត្រ នៃគម្រោងរូបិយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងជះឥទ្ធិពលដល់ការរៀបចំកម្មវិធីរបស់អង្គការអិសមីតេស៍ (លោកខាងលិចជួបខាងកើត) នៅក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកស្អាតនិងអនាម័យ។

គោលបំណងជាក់លាក់របស់ការពិនិត្យឡើងវិញពាក់កណ្តាលអាណត្តិ គឺ៖



2.2 វិធីសាស្ត្រ

2.2.1 វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃ និងវិធីនានា


ការពិនិត្យឡើងវិញពាក់កណ្តាលអាណត្តិ ផ្តោតលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើលទ្ធផលរឿងទុករបស់គម្រោងរូបិយចំនួន ៤ ជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នា គឺ ៖ ១) ភាពជាដៃគូ និងបណ្តាញការងារសម្រាប់ពង្រឹងប្រព័ន្ធ ២) ការកសាងសមត្ថភាពដៃគូ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធអំពីវិធីសាស្ត្រជំនួយផ្នែកលើលទ្ធផល និងក្រុមសមភាពយេនឌ័រនិងបរិយាប័ន្នសង្គម (ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រ និងគ្រួសារក្រីក្រងាយរងគ្រោះ) ៣) ការផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំ និងភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការងារទឹកស្អាត និងអនាម័យ ៤) លទ្ធភាពទទួលបានសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រ និងគ្រួសារក្រីក្រងាយរងគ្រោះ (ក្រុមសមភាពយេនឌ័រនិង បរិយាប័ន្នសង្គម)។

ការវាយតម្លៃត្រូវបានធ្វើឡើងជាចម្បងសម្រាប់គោលបំណងសិក្សា។ ការផ្តោតសំខាន់នៃការវាយតម្លៃ និងរបាយការណ៍នេះ គឺសំដៅទៅលើវិធី/របៀប ហេតុអ្វី និងស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈអ្វីខ្លះក្នុងការសម្រេចបានលទ្ធផល។ សំណួរវាយតម្លៃសំខាន់ៗចំនួន ៧ និងសំណួររងបន្ថែមបញ្ជាក់លើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការវាយតម្លៃទាំង ៥៖ ការដែលមានពាក់ព័ន្ធគ្នា ប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផល ផលប៉ះពាល់ និងនិរន្តរភាព។¹

ការពិនិត្យឡើងវិញពាក់កណ្តាលអាណត្តិនៅតាមមូលដ្ឋាន បានធ្វើឡើងជាការពិភាក្សាជាគ្រុមជាមួយដៃគូ ការសម្ភាសន៍ជាមួយសមាជិក គ.ក.ន.ក និង

¹លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អង្គការសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់គណៈកម្មាធិការជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ (DAC) លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ (DFAT)

ក្រសួង។ ខេត្តចំនួន ៣ បានចុះសិក្សា គឺខេត្តព្រៃវែង ខេត្តក្រចេះ និងខេត្តពោធិ៍សាត់។ ការចុះសិក្សានេះមាន ៥ ដំណាក់កាលដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យនៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញពាក់កណ្តាលអាណត្តិ។

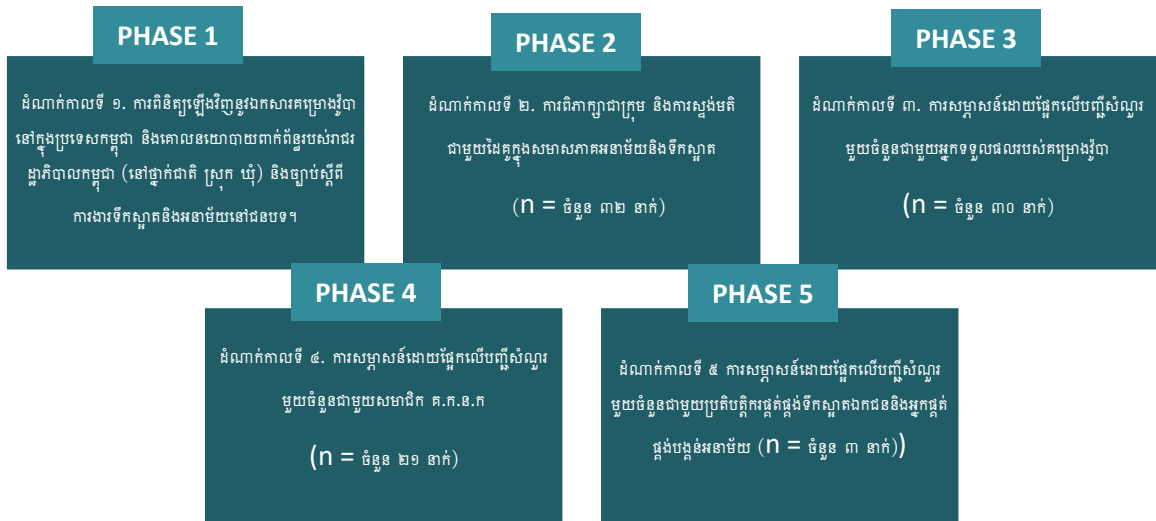

ការវាយតម្លៃក៏បានប្រើស្ថានភាពត្រួតពិនិត្យរបស់គម្រោងរដ្ឋបាល និងរបាយការណ៍របស់សមាគមទឹកស្អាតកម្ពុជា និង អង្គការជនពិការកម្ពុជា ដើម្បីបំពេញបន្ថែមលើទិន្នន័យការងារនៅតាមមូលដ្ឋាន។

2.2.2 ការមានប្រាំដែនកំណត់



ពេលវេលាខ្លីបានកំណត់ចំនួន និងភាពចម្រុះនៃអ្នកចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃនេះ។ វិសាលភាពនៃការវាយតម្លៃបានផ្ដោតជាចម្បងលើសហគមន៍អនាម័យនៅក្នុងខេត្តចំនួន ៣ ដោយសារតែពេលវេលាធ្វើដំណើរមានការកំណត់។



ភាពមានហានិភ័យខ្ពស់នៃអ្នកចូលរួមមានភាពលំអៀងត្រូវបានវាយការណ៍ ពីព្រោះគឺជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់គម្រោងរដ្ឋបាល ហើយបានទទួលបានប្រយោជន៍ក្នុងការឧបត្ថម្ភធន និងប្រាក់លើកទឹកចិត្តដែលផ្តល់ដោយគម្រោង។



កង្វះទិន្នន័យមូលដ្ឋាននិងក្របខ័ណ្ឌត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃសមស្រប ការដំណើរការ ឧបករណ៍ និងទិន្នន័យដើម្បីវាយតម្លៃឱ្យបានដឹងអំពីកំណើនគ្រប់ដណ្តប់របស់ការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យ និងការប្រែប្រួលនៅកម្រិតផ្សេងៗគ្នា (បុគ្គល អង្គការ ប្រព័ន្ធ) ដែលជាលទ្ធផលនៃគម្រោងរដ្ឋបាល។



ការពឹងផ្អែកលើការត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានបានផ្តល់ឱ្យគ្មានការវាយតម្លៃអំពីភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃទិន្នន័យដែលមានហានិភ័យរបស់អង្គការលោកខាងលិចជួបខាងកើត។

ការមានប្រាំដែនកំណត់ទាំងនេះបានកាត់បន្ថយតាមរយៈការវិភាគយ៉ាងហ្មត់ចត់នៃទិន្នន័យតាមមូលដ្ឋាន និងព័ត៌មាននៃការត្រួតពិនិត្យ ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រត្រីកោណមាត្រដ្ឋាន និងការវិភាគប្រៀបធៀបនៃទិន្នន័យបែបបរិមាណនិងគុណភាព។

3. ការរកឃើញ និងមេរៀនសំខាន់ៗ

KEQ1:

តើគម្រោងរដ្ឋបាលមានភាពស្របគ្នាទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការងារទឹកស្អាតនិង អនាម័យនៅជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងកម្រិតណា? (ការដែលមានពាក់ព័ន្ធគ្នា)

ផ្អែកលើការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធ គឺផែនការសកម្មភាពជាតិជំហាន១ (២០១៤-២០១៨) ផែនការសកម្មភាពជាតិជំហាន២ (២០១៩-២០២៣) យុទ្ធសាស្ត្រជាតិសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងការលើកកម្ពស់ អនាម័យនៅជនបទ ២០១១-២០២៥ និងយុទ្ធសាស្ត្រ សកម្មភាព និងលទ្ធផលរបស់គម្រោងរដ្ឋបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ស្របគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជា។ ប្រធានបទទាំង៥ រួមមានការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជន វិធីសាស្ត្រ ពហុភាគីពាក់ព័ន្ធ ការរៀបចំស្ថាប័ន ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានវិស័យ និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រ និងបរិយាប័ន្នសង្គម ត្រូវបានលើកឡើង និងចំណុចផ្តោតដ៏សំខាន់នៃឯកសារគោលនយោបាយត្រូវបានពិនិត្យមើលឡើងវិញ។

ឯកសារគោលនយោបាយដែលបានពិនិត្យមើលឡើងវិញបានបង្ហាញថា វិធីសាស្ត្រជំនួយផ្អែកលើលទ្ធផលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាសមស្រប។ វិធីសាស្ត្រជំនួយ ផ្អែកលើលទ្ធផលក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មទឹកស្អាតនិងអនាម័យរបស់គម្រោងរដ្ឋបាលមានភាពស្របគ្នាយ៉ាង ច្បាស់ជាមួយសេវាកម្មយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ និងស្ថានភាពលទ្ធផលក្នុងវិស័យទីផ្សារអនាម័យ និងការងារបំផុសរបស់គម្រោងរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់កម្រិត ការងារបំផុសនិងចលនាសង្គម និងការសាងសង់អនាម័យនៅនឹងកន្លែងតាមមូលដ្ឋាន (បង្កន់អនាម័យមានលក្ខណៈ) បានវាស់វែងដោយចំនួនបង្កន់ដែលបានសាងសង់សម្រាប់គ្រួសារដែលមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយបង្ក ន់អនាម័យ។

KEQ2. តើគម្រោងរដ្ឋបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បាននិងកំពុងអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផលកម្រិតណា? (ប្រសិទ្ធភាព/ប្រសិទ្ធផល)

គំរូនៃការអនុវត្តរបស់គម្រោងរដ្ឋបាល គឺផ្អែកលើបទពិសោធន៍ និងភាពជោគជ័យនៃគម្រោងឧបត្ថម្ភធនស្ថាប័នរបស់ជំនួយផ្អែកលើលទ្ធផលពីមុនរបស់អង្គការអ៊ីស មីតវេសត (លោកខាងលិចជួបខាងកើត) លើវិស័យអនាម័យនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ហើយអង្គការអង្គការអ៊ីសមីតវេសត បានបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ មន្ទីរ អ.ជ.ប ខេត្ត ដែលបានសន្មតថាការកសាងសមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជំនួយផ្អែកលើលទ្ធផលត្រូវ បានសម្រេចជោគជ័យរួចហើយ។ ការយល់ឃើញរបស់ដៃគូចំពោះគុណភាពនិងសុពលភាពរបស់អង្គ ការអង្គការអ៊ីសមីតវេសតស្តីពីភស្តុតាងនៃលទ្ធផលបង្កន់អនាម័យតាម រយៈពេលជំនួយផ្អែកលើលទ្ធផលនៅក្នុងគម្រោងមុនៗ គាំទ្រធ្វើឱ្យមានជំនឿដល់ដៃគូថា គម្រោងរដ្ឋបាលនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រោងទុកសម្រាប់សហគមន៍ជនបទដែលជាគ្រួសារក្រីក្រ និងគ្រួសារក្រីក្រងាយរងគ្រោះ។

ថ្វីបើមានភាពខុសប្លែកគ្នារវាងខេត្តនិងខេត្តទាក់ទងនឹងដៃគូដែលទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពអនុ វត្តក៏ដោយ ក៏រចនា សម្ព័ន្ធភាពជាដៃគូរបស់គម្រោងរដ្ឋបាលបាននិងកំពុងទទួលបានការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ ដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយមានក្រសួង អ.ជ.ប ជាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ។ រចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះគឺស្របតាមរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ហើយដូច្នោះវាមានប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែសម្រាប់គម្រោងរដ្ឋបាលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ ក្រសួង អ.ជ.ប ដើម្បីសម្រេចកំណើនគ្របដណ្តប់អនាម័យ ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្នាំ ២០២៥ ។

ចំណេះដឹងអំពីគម្រោងរដ្ឋបាល និងរបៀបដែលគម្រោងដំណើរការ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភធន ថ្លៃបង្កន់ លំហូរហិរញ្ញវត្ថុ មានភាពខុសប្លែកគ្នានៅតាមគ្រួសារក្នុងខេត្តទាំង៣។

វាហាក់ដូចជាមើលឃើញថា ហានិភ័យទាក់ទងនឹងនីតិវិធីនៃការអនុវត្ត ជាពិសេសលើសមត្ថភាពនិងឆន្ទៈរបស់ដៃគូក្នុងការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ត្រូវបានដោះស្រាយ

ហើយដូច្នោះការអនុវត្តបានសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនសម្រាប់គម្រោងបង្កន់អនាម័យ គឺបានសម្រេចមុនកាលកំណត់។

វិសាលភាពដែលសកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាល និងការកសាងសមត្ថភាពរបស់គម្រោងរ៉ូបា បានបំពេញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ដៃគូ មិនត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈក្រុមអ្នកចូលរួមពិភាក្សាឡើយ។ កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយប្រតិបត្តិករវិស័យ ឯកជនក៏បានបង្ហាញផងដែរថា វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់នូវចំណេះដឹងនិងការអនុវត្តលើការកែលម្អបច្ចេកទេសនៃការសាងសង់បង្កន់អនាម័យ ជាជាងការកែលម្អជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្តោត លើយុទ្ធសាស្ត្រជាតិក្នុងការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន នៅក្នុងរយៈពេលដែលនៅសល់នៃគម្រោងរ៉ូបា ជាពិសេសលើចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។ បញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ អាចត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងគម្រោងដើម្បីធានាផលប៉ះពាល់និងនិរន្តរភាពរបស់វា និងការអប់រំបន្ថែមទៀតសម្រាប់គ្រួសារដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

KEQ3. តើវិធីសាស្ត្រប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននៃគម្រោងរ៉ូបា និងការជួយទៅដល់សហគមន៍ក្រីក្រ និងក្រីក្រងាយរងគ្រោះ

នៅតំបន់ជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទឹកស្អាតនិងអនាម័យរបស់ពួកគេ ក្នុងកម្រិតណា? (ប្រសិទ្ធភាព/ផលប៉ះពាល់)

តម្រូវការទឹកស្អាតនិងអនាម័យរបស់សហគមន៍ជនបទ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ មុនពេលមានគម្រោងរ៉ូបា គ្រួសារជាច្រើនមិនមានបង្កន់អនាម័យទេ។ ពួកគេបានបន្ទោរបង់នៅតាមគុម្ពុតព្រៃភ្លៀរផ្ទះ រួមទាំងព្រៃឫស្សី និងវាលស្រែ។ ពីមុនអ្នកភូមិភាគច្រើនរស់នៅក្នុងបរិស្ថានមិនស្អាតនិងគ្មានអនាម័យ និងការបន្ទោរបង់គ្រប់ទីកន្លែងនៅតាមទិសាធារណៈ និងប្រឈមនឹងលក្ខខណ្ឌដែលជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សុខភាព ដូចជាពស់ចឹក ហើយសំខាន់បំផុតវាពិបាកកកកន្លែងស្អាតសម្រាប់ការបន្ទោរបង់នៅរដូវវស្សា ឬនៅពេលទឹកជន់ជន់លិចទីតាំងព្រៃ។ ប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ គឺទន្លេ ស្រះ និងទឹកភ្លៀងដែលរក្សាទុកហើយពួកគេងាយនឹងមានជំងឺដូចជាអាត និងជំងឺឆ្លងថ្មីៗ។

ថ្វីបើមានតម្រូវការយ៉ាងច្រើនក៏ដោយ ក៏លទ្ធភាពដែលអាចទទួលបាននៅតែជាឧបសគ្គសំខាន់សម្រាប់គ្រួសារក្នុងការសាងសង់បង្កន់អនាម័យ និងការតភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធទឹកទុយោ។ អ្នកក្រីក្រនៅជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាទូទៅពឹងផ្អែកលើការងារកម្លាំងពលកម្ម ឬការធ្វើស្រែនិងដំណាំ ប៉ុន្តែអ្នកទទួលបានលទ្ធភាពច្រើននៅតាមភូមិដែលបានទៅជួប គិតក្នុងចំណោមអ្នកក្រីក្រខ្លាំងនិងគ្មានដី។ ពួកគេមិនមានលុយទិញបង្កន់អនាម័យ និងផ្តល់អាទិភាពដល់ការសន្សំប្រាក់ដើម្បីទិញអង្ករនិងធ្វើការចំណាយប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅ និងការសិក្សាសម្រាប់កុមារ និងសម្រាប់ពេលលំបាកមានគ្រោះទឹកជន់ជន់ឬគ្រោះរាំងស្ងួត។ ពួកគេយល់ថា បង្កន់មានតម្លៃខ្ពស់ពេក ហើយពួកគេមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញវា ឬសន្សំប្រាក់សម្រាប់ការសាងសង់បង្កន់អនាម័យ និងការតភ្ជាប់ទឹកស្អាតនោះទេ។ គម្រោងរ៉ូបា ផ្តល់ការគាំទ្រដល់គ្រួសារដែលមានប័ណ្ណក្រីក្រប្រភេទ១ និងក្រីក្រប្រភេទ២ ដែលចេញដោយរបស់ក្រសួងផែនការ ចំណែកអ្នកដែលមិនមានប័ណ្ណក្រីក្រ អាចស្ថិតក្នុងលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យគម្រោងជាគ្រួសារក្រីក្រ និងគ្រួសារក្រីក្រងាយរងគ្រោះ និងដោយមានតម្រូវការទឹកស្អាតនិងអនាម័យ និងមានបំណងសាងសង់បង្កន់អនាម័យផងដែរ។ គ្រួសារជាច្រើនបានយល់ឃើញថាប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នាំ ក៏សម្រាប់ការផ្តល់ប័ណ្ណក្រីក្រក៏ផ្អែកលើឆន្ទានសិទ្ធិរបស់អាជ្ញាធរ និងមិនបានគ្របដណ្តប់គ្រួសារក្រីក្រទាំងអស់ទេ។ នេះបាននិងកំពុង បង្កើតឡើងជាអកុសលនូវការយល់ឃើញថា គម្រោងរ៉ូបាមិនមានសមភាពក្នុងការទទួលបាននូវសេវាកម្មទឹកស្អាត និងអនាម័យ បើផ្អែកតាមវិធីសាស្ត្រប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន។ ទស្សនៈនេះក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ សមាជិក គ.ក.ន.ក ផងដែរ។

អ្នកទទួលបានផលភាគច្រើនបានសម្ភាសន៍ មានអារម្មណ៍ថា
ការឧបត្ថម្ភធនអាចជួយដល់ការទទួលបានបង្កន់អនាម័យសម្រាប់ពួកគេ
ហើយដូច្នោះវាជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការបង្កើនអត្រាអនាម័យមានការកែលម្អសម្រាប់សហគមន៍ទាំងនេះ
។ ដៃគូជាពិសេស អ្នកផ្គត់ផ្គង់បង្កន់អនាម័យក៏មានអារម្មណ៍ថា
គម្រោងឧបត្ថម្ភធនគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការធ្វើឱ្យមនុស្សសាងសង់បង្កន់អនាម័យ។

**KEQ4. តើវិធីសាស្ត្ររបស់ គម្រោងវ័បា ក្នុងការផ្តល់អំណាចយេនឌ័រតាមរយៈការចូលរួមរបស់
គ.ក.ន.ក បាននិងកំពុងធ្វើឱ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីបញ្ហាយេនឌ័រ
និងការផ្តល់អំណាចយេនឌ័របានប្រសើរឡើង សម្រាប់ គ.ក.ន.ក និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត
ដែរឬទេ? (ប្រសិទ្ធភាព/ផលប៉ះពាល់)**

ទស្សនៈទូទៅនៃការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យជាការងារផ្ទះ និងសម្រាប់សុវត្ថិភាពដល់ស្ត្រី
គឺការពង្រឹងបទដ្ឋានយេនឌ័រ
ដែលពិពណ៌នាថាស្ត្រីជាអ្នកមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យ
ទោះបីជាទស្សនៈទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញជាញឹកញាប់ដោយបុរសនៅក្នុងក្រុមពិភាក្សាក៏ដោយ។ អ្នក
ផ្តល់ការសម្ភាសន៍ជា គ.ក.ន.ក មានការយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីយេនឌ័រ
និងបរិយាប័ន្នសង្គម។ គ.ក.ន.ក ជាច្រើនយល់ថា គម្រោងវ័បា
បាននិងកំពុងបង្កលក្ខណៈឱ្យពួកគាត់រៀនសូត្រ
បន្ថែមអំពីតម្រូវការក្នុងការជួយដល់សហគមន៍ដែលក្រីក្រ
និងក្រីក្រងាយរងគ្រោះ។ កាលពីអតីតកាល
ការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបញ្ហារបស់គ្រួសារនីមួយៗ
ហើយជាទូទៅវាត្រូវបានគេទទួលយកថា លទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតនិងអនាម័យ
គឺសម្រាប់អ្នកដែលមានមធ្យោបាយសេដ្ឋកិច្ច។ ស្ត្រីជា គ.ក.ន.ក ភាគច្រើនបានដឹងថា
ទឹកស្អាតនិងអនាម័យ គឺជាតម្រូវការមូលដ្ឋាន
ហើយវាគួរតែអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប។

អ្នកផ្តល់ការសម្ភាសន៍ជា គ.ក.ន.ក ភាគច្រើនយល់ថា
ពួកគេបានរៀនអំពីតួនាទីយេនឌ័រនៅក្នុងការងារទឹកស្អាតនិង
អនាម័យតាមរយៈដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នា នៃគម្រោងវ័បា
ហើយការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅដល់ សហគមន៍។ ទោះយ៉ាងនេះក៏
ក៏នៅមានអ្នកដែលមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីយេនឌ័រដោយសារពួកគេទើបតែជាប់ឆ្នោតក្នុង
តួនាទីថ្មីនេះ ហើយមិនទាន់បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលដែលពាក់ព័ន្ធ។

អ្នកផ្តល់ការសម្ភាសន៍ជា គ.ក.ន.ក ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យធ្វើការជាមួយគម្រោងវ័បា
ដោយមូលហេតុ៣យ៉ាង៖ ទីមួយ គម្រោងវ័បា
បានផ្តល់ឱកាសឱ្យពួកគេទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យដែលពួកគេអាច
ប្រើដើម្បីអប់រំដល់អ្នកភូមិ។ ទីពីរ គម្រោងវ័បា
បានផ្តល់ថវិកាខ្លះសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅសហគមន៍ដែលពួកគេអាចចុះទៅអប់រំដល់អ្នកភូមិដែលជាផ្នែក
មួយនៃគម្រោងវ័បា ហើយក៏ដើម្បីប្រមូលបានបញ្ហាចម្បងរបស់គ្រួសារ និងបញ្ហាបញ្ហាចម្បង
ទាំងនេះទៅក្នុងផែនការវិនិយោគ។ ទីបី

អ្នកខ្លះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តផ្អែកតាមតម្រូវការជាក់ស្តែងក្នុងការគាំទ្រដល់សហគមន៍ ក្រីក្រ
និងនិងក្រីក្រងាយរងគ្រោះ
។ ថ្វីបើមានការជម្រុញលើកទឹកចិត្តនិងចំណាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់ការងារទឹកស្អាត
និងអនាម័យទៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដោយ ក៏ គ.ក.ន.ក
ភាគច្រើនយល់ឃើញថាពួកគេមានករណីកិច្ចក្នុងការទទួលបានតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវដែលមេឃុំ
ប្រគល់ឱ្យពួកគេ។ ពួកគេត្រូវអនុវត្តតាម
និងរៀបចំផែនការការងាររបស់ពួកគេដើម្បីសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍនានា ការិយាល័យ
អ.ជ.ប ស្រុក មន្ទីរ អ.ជ.ប ខេត្ត ក្រុមហ៊ុនសាងសង់បង្កន់ អនាម័យ
ឬធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដោយខ្លួនឯង។ អ្នកផ្តល់ការសម្ភាសន៍ជា គ.ក.ន.ក
មួយចំនួនបានលើកឡើងនូវកង្វល់អំពីវិប្បធម៌នៃការគ្រប់គ្រងដោយបុរសនៅកន្លែងធ្វើការងារ។

គ.ក.ន.ក បានមើលឃើញខ្លួនឯងថា
ជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យតាមរយៈការអនុវត្តការចលនារបស់
ពួកគេ។ នេះដោយសារតែពួកគេមានតួនាទីផ្ទាល់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដល់សហគមន៍អំពីទំនាក់ទំនង

វាងការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យ និងសុខភាព ហើយបានជួយអ្នកភូមិឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ ឬទម្លាប់ ឧទាហរណ៍ជីកតែទឹកស្អាត ទឹកបន្លាច ឬទឹកទុយោ។

ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ការផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រី អ្នកផ្តល់ការសម្ភាសន៍ជា គ.ក.ន.ក ភាគច្រើនបាននិយាយអំពីតម្រូវការនូវជំនាញនានាឱ្យប្រសើរឡើង និងទំនុកចិត្តដើម្បីធ្វើការជាមួយមនុស្សផ្សេងៗគ្នា។

KEQ5. តើគម្រោងរ៉ូបា បានពង្រឹងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទ នៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីអនុវត្ត និងធ្វើឱ្យមាននិរន្តរភាពចំពោះវិធីសាស្ត្រជំនួយផ្នែកលើលទ្ធផលក្នុងការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យប្រ កបដោយបរិយាប័ន្ននៅជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា -

បានសម្រេចតាមរយៈតម្រូវការសហហិរញ្ញប្បទានរបស់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងកម្រិតណាដែរ? (ប្រសិទ្ធភាព/ប្រសិទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់)

គម្រោងរ៉ូបា

ប្រើរចនាសម្ព័ន្ធនានាជនបទដែលមានស្រាប់ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែលមានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការកៀរគរដៃគូពាក់ព័ន្ធចូលរួមដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មអនាម័យ និងលើកកម្ពស់អនាម័យស្តីពីការលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូនៅសហគមន៍ជនបទ។ ដៃគូអាចធ្វើការ ជាមួយគ្នាបានពីព្រោះពួកគេយល់ពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ពួកគេ និងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមរចនាសម្ព័ន្ធដ្នកដែលមានស្រាប់។

ការអនុវត្តដូច្នោះ គម្រោងរ៉ូបាត្រូវបានគ្រោងឡើងដើម្បីពង្រីករចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចដែលមានស្រាប់ ជាជាងការផ្លាស់ប្តូរវា។ ចំណែកឯ ផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងរ៉ូបាទៅលើការពង្រឹងប្រព័ន្ធហាក់ដូចនៅមានកម្រិត។

តំណាងនាយកដ្ឋានថែទាំសុខភាពជនបទនៃក្រសួង អ.ជ.ប បានបញ្ជាក់ពីការរួមចំណែករួមគ្នាជាមួយ មន្ទីរ អ.ជ.ប ខេត្ត លើការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់អ្នកភូមិអំពីអនាម័យ ការលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូ និងទឹកស្អាត។ ការងារនេះគឺស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗរបស់គម្រោងរ៉ូបា (ទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរ) ស្តីពីការកសាងសមត្ថភាពដៃគូរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឱ្យមានជំនាញ សមត្ថភាព និងប្រព័ន្ធដែលត្រូវការដើម្បីអនុវត្តជំនួយផ្នែកលើលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកទទួលបានផលគោលដៅ។ ទោះយ៉ាងនេះក៏ដោយ បើពុំមានទិន្នន័យដើមគ្រា ឬវិធីសាស្ត្រនៃការវាយតម្លៃការផ្លាស់ប្តូរនៅកម្រិតបុគ្គល និងស្ថាប័នក្នុងសកម្មភាពអនុវត្តបច្ចុប្បន្នទេនោះ វាក៏មិនអាចវាយតម្លៃថាតើយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាដែរ។

វិធីសាស្ត្រនៃការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរួមគ្នាដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ឃុំ ដែលនាំឆ្ពោះទៅដើម្បីធ្វើឱ្យមានជំនួយផ្នែកលើលទ្ធផលជាផ្នែករបស់ឃុំ (ស្ថាប័ន) នៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន។ ឃុំខ្លះអាចរួមចំណែកថវិកាបានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ ហើយឃុំខ្លះទៀតមិនអាចចូលរួមបានដោយសារគ្មានខ្ទង់ថវិកា។ កត្តាផ្សេងទៀត គឺតម្រូវដើម្បីធ្វើឱ្យទៅជាផ្នែករបស់ស្ថាប័នស្តីពីការផ្តល់សេវាកម្មទឹកស្អាតនិងអនាម័យផ្នែកលើលទ្ធផលដែលត្រូវបានស្វែងរកមតិកាទ្រទ្រង់យុទ្ធសាស្ត្រជាតិ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការអនុវត្តផ្សេងៗគ្នានៃជំនួយផ្នែកលើលទ្ធផលនៅបណ្តាខេត្តគោលដៅ និងការផ្តល់ព័ត៌មាននៅមានកម្រិតអំពីដំណើរការនៃជំនួយផ្នែកលើលទ្ធផល បាននិងកំពុងផ្តល់លទ្ធផលសម្រាប់ជាការយល់ដឹងសកលមួយអំពីជំនួយផ្នែកលើលទ្ធផលជាការឧប ត្មម្ភធនដែលមានរយៈពេលខ្លីជាជាងការធ្វើឱ្យទៅជាផ្នែករបស់ស្ថាប័នដែលជាយន្តការ ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានជំនួយផ្នែកលើលទ្ធផលរយៈពេលវែងក្នុងការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យ។

KEQ6. តើគម្រោងរ៉ូបា

បាននិងកំពុងធ្វើឱ្យមានការចូលរួមពីប្រតិបត្តិការវិស័យឯកជនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មទឹកស្អាតនិងអនាម័យសម្រាប់សហគមន៍ក្រីក្រនិងក្រីក្រងាយរងគ្រោះ (ក្រុមសមភាពយេនឌ័រនិងបរិយាប័ន្នសង្គម) ក្នុងកម្រិតណាដែរ? (ប្រសិទ្ធភាព)

ប្រតិបត្តិការវិស័យឯកជនបានធ្វើសម្ភាសន៍ បានយល់ដឹងអំពីគម្រោងឧបត្ថម្ភធន ហើយអាចផ្តល់សេវាកម្មទឹកស្អាត និង អនាម័យដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារក្រីក្រងាយរងគ្រោះ (ក្រុមសមភាពយេនឌ័រនិងបរិយាប័ន្នសង្គម) ក្រោមគម្រោងទាំងនេះ។ ប្រការនេះគឺបណ្តាលមកពីការមានទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងដែលពួកគេ មានជាមួយអង្គការអំណោយជូនលិចជួបខាងកើត ពីគម្រោងមុនៗ។ ក្រុមហ៊ុនសម្ភាសន៍អនាម័យធនបទ បានទទួលការគាំទ្រពីគម្រោងឧបត្ថម្ភធនស្រដៀងគ្នានេះតាមរយៈអង្គការលោកខាងលិចជួបខាង កើត តាំងពីឆ្នាំ ២០១៤ ។

តម្លៃសមរម្យ (អាចទិញបាន)

ក៏ជាបញ្ហាទាក់ទងនឹងគុណភាពនៃការសាងសង់បង្គន់អនាម័យផងដែរ។ ដោយសារការសាងសង់បង្គន់របស់គម្រោងរ៉ូបា មិនមានការធ្វើជារចនាសម្ព័ន្ធនាងបង្គន់ និងដំបូលទេ វាប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់បង្គន់ ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកទទួលបានផលដែលរស់នៅក្នុងបរិស្ថានប្រឈមនឹងអាក្រក់និងជនលិច។ កង្វះការប្រើប្រាស់បង្គន់មានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកភូមិដទៃទៀតពិសេសពួកគេមិនអាចមើលឃើញពីតម្លៃបង្គន់អនាម័យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់រយៈពេលវែង។ នៅក្នុងតំបន់ដែលបានទៅពិនិត្យភាគច្រើន គ្រួសារជាច្រើននៅតែពឹងផ្អែក លើស្រះ និងពាងត្រងទឹកភ្លៀងសម្រាប់ជាប្រភពទឹកប្រើប្រាស់។ បញ្ហានេះវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេ ហើយថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាពិសេសប្រតិបត្តិការទឹក ព្រោះពួកគេត្រូវការនូវតម្រូវការជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់គ្រួសារដើម្បីធានាដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

គម្រោងរ៉ូបា

បាននិងកំពុងចូលរួមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយប្រតិបត្តិការវិស័យឯកជនទាំង៣ដែលបានធ្វើសម្ភាសន៍ និងក្នុងការធ្វើភាពជាដៃគូជាមួយសមាគមទឹកស្អាតកម្ពុជា ។ អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានទាំងអស់បានយល់ដឹងអំពីគម្រោងរ៉ូបា និងវិធីសាស្ត្រនៃការផ្តល់សេវាកម្មតាមរយៈគម្រោងឧបត្ថម្ភធន ដោយសារតែពួកគេទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងមុនៗ ជាមួយអង្គការលោកខាងលិចជួបខាងកើត។ ពួកគេទាំងអស់បានប្តេជ្ញាដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវគោលដៅកំណត់នៃការសាងសង់បង្គន់អនាម័យ និងការតភ្ជាប់បណ្តាញទឹកទយោ ហើយថែមទាំងបានចូលរួមចំណែកជួយផ្តល់ថវិកាដើម្បីជួយដល់គ្រួសារដែលមិនអាចទូទាត់ប្រាក់បាន ។

ទាក់ទងនឹងការបណ្តុះបណ្តាល លទ្ធផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់រួមមាន ១) ការយល់ដឹងរបស់អ្នកសាងសង់បង្គន់អនាម័យអំពីការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន ដែលជាលទ្ធផលទទួលបានពីការបណ្តុះបណ្តាលលើការសាងសង់បង្គន់អនាម័យសម្រាប់ជនមានពិការភាព ២) គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សមាគមទឹកស្អាតកម្ពុជាក្នុងការអប់រំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអំពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មទឹក។ ទោះបីជាបាននិយាយអំពីការបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មក៏ដោយ ក៏នៅមិនទាន់មានភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីការអនុវត្តជាក់ស្តែងលើចំណេះដឹងនិងជំនាញអាជីវកម្ម និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។

KEQ7. តើគម្រោងរ៉ូបា មានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ (ដោយចេតនា និងអចេតនា)

ហើយតើវាមាននិរន្តរភាពរបៀបណាដែរ? (ផលប៉ះពាល់/និរន្តរភាព)

តាមទស្សនៈរបស់អ្នកទទួលបាន គម្រោងរ៉ូបា បាននិងកំពុងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបន្ថោរបងពាស វាលពាលកាល មានចំពោះសុខភាពមនុស្ស។ ពួកគេក៏ទទួលបានចំណេះដឹងអំពីរបៀប

និងពេលណាត្រូវលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូនៅគ្រាដំបូងខាងៗ។ ការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីការងារ
ទឹកស្អាតនិងអនាម័យ និងសុខភាព

បាននិងកំពុងនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាចំពោះការអនុវត្តការអនាម័យខ្លួនប្រាណ
និងការលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូ។ ពួកគេបាននិយាយអំពីការយល់ដឹងនៃការពាក់ម៉ាស់
ការរក្សាគម្លាតសង្គម និងការអនុវត្តអនាម័យនៃការប្រើប្រាស់បង្គន់
និងអនាម័យខ្លួនប្រាណ។ ពួកគេបានកត់សំគាល់ថាការលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូ
បានក្លាយជាទម្លាប់ជាប្រចាំ។ ពួកគេបានប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យជាប្រចាំ
ហើយយល់ថាមានសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវឯកជនភាព ជាពិសេសសម្រាប់កុមារ
ក្មេងស្រី ស្ត្រី និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ។

ផលប៉ះពាល់ដែលមានចេតនាក្នុងការទទួលបានទឹកស្អាតតាមរយៈការតភ្ជាប់បណ្តាញទឹកទុយោ
គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់និងការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការផឹកទឹកមានសុវត្ថិភាព
និងកាត់បន្ថយពេលវេលាដើម្បីទៅដងទឹកពីទន្លេ ឬពីប្រភពផ្សេងទៀត។
ទោះបីជាអ្នកទទួលបានផលភាគច្រើនបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានផឹកទឹកដាច់ខាត ទឹកចម្រោះ
ទឹកបន្សុទ្ធ និងទឹកដបដែលត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅទូទាំងខេត្តចំនួន៣ ក៏ដោយ ក៏ប្រជាពលរដ្ឋ
ជាច្រើននៅតែប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកផ្សេងទៀតដែរ។ ឧទាហរណ៍
អ្នកទទួលបានផលខ្លះនៅខេត្តព្រៃវែងនៅតែផឹកទឹកមិនបានដាច់ខាត។ ទឹកត្រូវបានគេយកចេញពីទឹកក្រោ
មដី (ទឹកអណ្តូង)

ហើយរក្សាទុកមួយអាទិត្យក្នុងពាងមុនពេលប្រើ។ ពួកគេនៅតែជឿជាក់ថាទឹកនេះមានសុវត្ថិភាព។

នៅកម្រិតដ៏ទូលំទូលាយ សមិទ្ធផលនៃគម្រោងរ៉ូបា ក្នុងការផ្តល់លទ្ធភាពប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យ
បាននិងកំពុងរួមចំណែកយ៉ាងច្បាស់ក្នុងការពង្រឹងអត្រាក្របដណ្តប់បង្គន់អនាម័យឆ្ពោះទៅសម្រេ
ចគោលដៅអនាម័យនៃយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ១០០% ត្រឹមឆ្នាំ ២០២៥

នៅទូទាំងប្រទេស។ ទោះយ៉ាងណានេះក៏ ដៃគូបានយល់ស្របថា គម្រោងរ៉ូបា
គឺជាការអនុវត្តរយៈពេលខ្លី

ហើយដើម្បីធានានូវនិរន្តរភាពនៃអត្រាបង្គន់អនាម័យដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ
ការគាំទ្រពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមរយៈការផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យនៅថ្នាក់រុំ
តាមរយៈផែនការវិនិយោគរុំ គឺមានសារៈសំ

ខាន់។ ផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតនៃគម្រោងរ៉ូបាទាក់ទងនឹងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃជីវភាពរស់នៅ
មានការពិបាកក្នុងការវាយតម្លៃ។ សម្រាប់សហគមន៍ទាំងនេះ

ជីវភាពរស់នៅមានភាពប្រសើរឡើងប្រកបដោយនិរន្តរភាព
គឺត្រូវការវិធានការបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយភាពងាយរងគ្រោះជាច្រើនដែលបណ្តាលមកពីវិបត្តិសេដ្ឋ
កិច្ច និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដោយសារមនុស្សជាច្រើនគ្មានដីឬស្មើតែគ្មានដី
ហើយពឹងផ្អែកលើការលក់កម្លាំងពលកម្ម ឬការធ្វើស្រែ
និងការដាំដំណាំសម្រាប់លក់យកជាសាច់ប្រាក់។

មានការរកហើញចម្រុះទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ដែលមានចេតនា
នៃគម្រោងរ៉ូបាលើការពង្រឹងវិស័យឯកជនដើម្បីដំណើរការប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅជនបទនៃប្រ

ទេសកម្ពុជា។ ទោះបីជាគោលដៅបង្គន់អនាម័យត្រូវបានសម្រេចក៏ដោយ
ក៏មានភ័ស្តុតាងតិចតួចដែលបង្ហាញថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់បង្គន់អនាម័យឯកជនទាំងនេះនឹងដំណើរការប្រ

កបដោយនិរន្តរភាពក្រោយគម្រោងរ៉ូបា
ឬបន្តផ្តល់សេវាកម្មដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារក្រីក្រងាយរងគ្រោះ (ក្រុមសមភាពយេនឌ័រនិងបរិយា

ប័ន្នសង្គម)។ កង្វះការចូលរួមបដិភាគរួមគ្នាប្រកបដោយនិរន្តរភាពពីរដ្ឋាភិបាល
គឺជាកត្តាដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់និរន្តរភាពវិស័យឯកជន

និងការធ្វើឱ្យទៅជាផ្នែករបស់ស្ថាប័ននៃយន្តការជំនួយផ្នែកលើលទ្ធផលដើម្បីធ្វើឱ្យមាននិរន្តរភាពនូវវិ
ធីសាស្ត្រក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មទឹកស្អាតនិងអនាម័យ។

ប្រតិបត្តិការវិស័យឯកជនហាក់ដូចជាមានឆន្ទៈក្នុងការជួយរំលែកថ្លៃជាមួយគ្រួសារក្នុងកំឡុងពេលនៃ
គម្រោងរ៉ូបា ដើម្បីបង្កើនអតិថិជន

ប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការបន្តជួយរំលែកថ្លៃក្នុងរយៈពេលវែងដោយមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញ។

មានផលប៉ះពាល់ខ្លះដោយអចេតនា។ ភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារខ្លះ
បាននិងកំពុងធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩

និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ គ្រួសារខ្លះត្រូវបានស្នើដោយអ្នកបំផុសអនាម័យឱ្យប្រើប្រាស់ថវិកាឧប
ត្ថម្ភជីវិត - ១៩

របស់ពួកគេពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង់ថ្លៃបង្គន់អនាម័យ។ ស្ត្រីក៏ទទួលបានការលំបាកច្រើនផងដែរដោយ
សារតែបាត់បង់ការងារឬប្តីរបស់ពួកគេបានធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើ។

4. អនុសាសន៍

ការត្រួតពិនិត្យ & វាយតម្លៃ

- រៀបចំ និងអនុវត្តដំណើរការ និងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃដែលសមស្របសម្រាប់ការតាមដានលទ្ធផលគ្រួសារក្រីក្រដោយរងគ្រោះ (ក្រុមសមភាពយេនឌ័រនិងបរិយាប័ន្នសង្គម) លទ្ធផលពង្រឹងប្រព័ន្ធនិងលទ្ធផលវិស័យឯកជនរួមជាមួយការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលភ្លាមៗ (ខ្លី/មធ្យម)។ សូចនាករនិងព័ត៌មានបែបគុណភាព គួរតែត្រូវបានប្រមូលនៅដើមគ្រាតាមរយៈការអនុវត្តដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអង្គការលោកខាងលិចជួបខាងកើត ក្នុងប្រទេសនិង វាយការណ៍ អំពីប្រភេទនៃលទ្ធផលទាំងនេះ (វាជាការចង់បានរបស់គម្រោងវ័ប្រា) ក្នុងមធ្យមបាយដំមានន័យ និងការទ្រង់ទ្រាយវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងដែលសម្របទៅនឹងលទ្ធផលនៃការអនុវត្តទាន់ពេលវេលា។
- កំណត់ទិន្នន័យដើមគ្រា និងបង្កើតប្រព័ន្ធប្រមូលទិន្នន័យ និងរបាយការណ៍អំពីការចុះឈ្មោះសាងសង់បង្គន់ ការសាងសង់បង្គន់ ការផ្ទៀងផ្ទាត់បង្គន់ ការទូទាត់ថ្លៃបង្គន់ ការឧបត្ថម្ភធនដល់គ្រួសារ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្តដល់ដៃគូនៅថ្នាក់ប្រជាជន ការិយាល័យ អ.ជ.ប ស្រុក មន្ទីរ អ.ជ.ប ខេត្ត គ.ក.ន.ក ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធអនាម័យជនបទ និង អង្គការលោកខាងលិចជួបខាងកើត។ ការងារនេះនឹងធានាឱ្យមានតម្លាភាពក្នុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងការកត់ត្រាឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវចំនួនបង្គន់។
- កំណត់ទិន្នន័យដើមគ្រា និងបង្កើតប្រព័ន្ធប្រមូលទិន្នន័យ និងរបាយការណ៍អំពីការចុះឈ្មោះតភ្ជាប់ទឹកទុយោ ការតភ្ជាប់ទឹកទុយោ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ការតភ្ជាប់ទឹកទុយោ ការទូទាត់ថ្លៃតភ្ជាប់ទឹកទុយោ ការឧបត្ថម្ភធនដល់គ្រួសារនៅថ្នាក់ប្រជាជន សមាគមទឹកស្អាតកម្ពុជា ប្រតិបត្តិករទឹក និងអង្គការលោកខាងលិចជួបខាងកើត។
- ទិន្នន័យដើមគ្រាសម្រាប់បង្គន់អនាម័យ គួរតែត្រូវបានប្រមូលផ្តុំចេញពីទិន្នន័យផ្សេងៗរបស់ក្រសួងផែនការ ហើយធ្វើការវិភាគដើម្បីវាយការណ៍ជាប្រចាំអំពីការផ្លាស់ប្តូរនៃការគ្របដណ្តប់ទាក់ទងនឹងការសាងសង់បង្គន់របស់គម្រោងវ័ប្រា។
- ទិន្នន័យដើមគ្រាសម្រាប់គម្រោងទឹកស្អាត គួរតែត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ខេត្ត មិនត្រឹមតែសម្រាប់តាមតំបន់គ្របដណ្តប់សេវានៃគម្រោងទឹកស្អាតនៅក្នុងគម្រោងវ័ប្រា ប៉ុណ្ណោះទេ។ ប្រការនេះអាចជួយដល់ការធ្វើរបាយការណ៍ជាប្រចាំ ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរនៃការគ្របដណ្តប់ទឹកស្អាតទាក់ទងនឹងគម្រោងវ័ប្រា ស្របតាមជាមួយនិងគម្រោងអនាម័យ។
- បង្គន់អនាម័យបានសាងសង់ និងទឹកទុយោបានតភ្ជាប់ គួរតែត្រូវបានវិភាគ និងធ្វើរបាយការណ៍ដែលប្រើទិន្នន័យបែងចែកតាមយេនឌ័រ/ភេទ និងប្រភេទនៃគ្រួសារក្រីក្រដោយរងគ្រោះ (ក្រុមសមភាពយេនឌ័រនិងបរិយាប័ន្នសង្គម)នៅកម្រិតគ្រួសារ និងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ។
- អង្គការលោកខាងលិចជួបខាងកើត គួរតែត្រូវបានប្រមូលស្ថាប័នដៃគូដោយមានគោលបំណង និងផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការធ្វើផ្លាស់ប្តូរតាមស្ថាប័ន បុគ្គល និងប្រព័ន្ធ។ ប្រការនេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំផែនការ និងការឯកភាពលើសូចនាករនៃការផ្លាស់ប្តូរដែលត្រូវតាមដាន និងវាយការណ៍ដោយដៃគូ និងសំយោគដោយអង្គការលោកខាងលិចជួបខាងកើត និងមតិទ្រទ្រង់ទៅកាន់ដៃគូ។

ព័ត៌មានអំពីគម្រោងវ័ប្រា

- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកញ្ចប់ព័ត៌មាននៃគម្រោងវ័ប្រាដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យគ្រួសារនិង គ.ក.ន.ក ដូច្នោះវាមានព័ត៌មានពេញលេញអំពី ១) គម្រោងវ័ប្រា (អង្គការលោកខាងលិចជួបខាងកើត ក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ជាម្ចាស់ជំនួយ ទឹកសម្រាប់ស្ត្រីជាមូលនិធិ និងដៃគូពាក់ព័ន្ធ) ២) គម្រោងវ័ប្រា និងរបៀបដំណើរការ ៣) អត្រាឧបត្ថម្ភធន និងភាពមានសិទ្ធិទទួលបាន ៤) ថ្លៃបង្គន់/ថ្លៃតភ្ជាប់ទឹកទុយោ/អត្រាបង់ថ្លៃទឹក ៥) ប្រភេទបង្គន់អនាម័យដែលអាចសាងសង់បាន/លទ្ធភាពតភ្ជាប់ទឹកទុយោ ៦) ជំហានពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃគម្រោងវ័ប្រា ៧) ចំណាយដែលរំពឹងទុកនិងចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ ៨) អត្ថប្រយោជន៍ និង ៩) ពេលវេលា។ កញ្ចប់ព័ត៌មាននេះគួរតែមានលក្ខណៈជាស្តង់ដារ (លេខ ១ ដល់ ៦) និងព័ត៌មានតាមករណីនីមួយៗ (លេខ ៧ ដល់ ៩)។

- ប្រើកម្មវិធី និងខ្លឹមសារឱ្យសមស្របនៅក្នុងកញ្ចប់ព័ត៌មានដែលត្រូវទៅនឹងមនុស្សចាស់ ជនមានពិការភាព និងមនុស្សដែលមិនចេះអក្សរ (ឧទាហរណ៍កំនូរជីវចល កំនូរ វីដេអូ ប្រូបភាព)។
- ផ្តល់កញ្ចប់ព័ត៌មានទៅដល់សមាជិក គ.ក.ន.ក ទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះជាផ្នែកមួយនៃការចាប់ផ្តើមរបស់ពួកគេក្នុងគម្រោងវ្លុំ ប្រាកដនេះអាចកើតឡើងតាមរយៈការបង្កើតវីដេអូ និងជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ចូលឯកសារចាំបាច់ដែលពួកគេត្រូវអាន និងផ្តល់តាមអ៊ិនធឺណិត។
- បញ្ចូលសំណួរដើម្បីធ្វើតេស្តចំណេះដឹងនៅក្នុងវីដេអូបណ្តុះបណ្តាល ហើយអ្នកចូលរួមត្រូវទទួលបានពិន្ទុជាក់លាក់ដើម្បីឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តចំណេះដឹងនៃគម្រោង វ្លុំបា មនុស្សពិការភាពអាចចាប់ផ្តើមសកម្មភាពចលនាសហគមន៍។ លទ្ធផលនៃការបណ្តុះបណ្តាល គួរតែជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការត្រួតពិនិត្យនិងវាយការណ៍ជាទៀងទាត់របស់អង្គការ លោកខាងលិចជួបខាងកើត។

ជំនាញអាជីវកម្ម ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រង របស់ប្រតិបត្តិករវិស័យឯកជន

- កែលម្អនិងផ្តល់ជូនកញ្ចប់បណ្តុះបណ្តាលដែលបានផ្តល់ជូនដល់វិស័យឯកជនលើជំនាញអាជីវ កម្ម ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។ សំណួរ ប្រាក់ប្តូរសម្រាប់ការសាកល្បង អាចត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងវគ្គបណ្តុះ បណ្តាល ហើយអ្នកចូលរួមត្រូវតែទទួលបានពិន្ទុជាក់លាក់មួយដើម្បីឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តចំណេះដឹងផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ និងជំនាញអាជីវកម្ម។
- ធ្វើការប្រជុំជាទៀងទាត់ជាមួយប្រតិបត្តិករវិស័យឯកជនដើម្បីពិភាក្សាអំពីកត្តាវាងស្នះ កត្តាងាយស្រួល ឱកាស និង ហានិភ័យនៅក្នុងសកម្មភាពនៃគម្រោងវ្លុំបា និងធ្វើការជាមួយពួកគេដើម្បីបង្កើតផែនការសកម្មភាពដែលត្រូវអនុវត្តនិងកែសម្រួលជាប្រ ចាំ។ កត់ត្រាលំហូររបស់ប្រតិបត្តិករវិស័យឯកជនទាំងអស់ (ក្រុមហ៊ុនអនាម័យ ជាងសង់បង្កន់អនាម័យ ហាងលក់សម្ភារៈសំណង់ ក្រុមហ៊ុនទឹក) ដែលធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងវ្លុំបា។

ការកសាងសមត្ថភាពស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការបន្សុំ

- រៀបចំកញ្ចប់បណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ វិធានការបន្សុំក្នុងអនាម័យ និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ដៃគូទាំងអស់។ ខ្លឹមសារនៃការបណ្តុះបណ្តាលគួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើ ងដោយអ្នកជំនាញផ្នែកប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអង្គការ លោកខាងលិចជួបខាងកើត។
- ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបានគ្រោងទុក (តាមអនឡាញ ឬចូលរួមផ្ទាល់) ដល់ដៃគូប្រតិបត្តិករវិស័យឯកជន គ.ក.ន.ក និងតាមខ្នងផ្ទះ។ ការវាយតម្លៃលើជំនាញនិងចំណេះដឹង គួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ការបណ្តុះ បណ្តាល ហើយនឹងជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ របស់អង្គការលោកខាងលិចជួបខាងកើត។
- បង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាធន់នឹងអាកាសធាតុក្នុងការងារអនាម័យនិងទឹក ស្អាត និងការសាកល្បងដើម្បីលើកកម្ពស់ការគិតដល់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ និងដំណោះស្រាយជាក់ស្តែង។ មូលនិធិនេះអាចត្រូវបានស្វែងរកពីដៃគូរដ្ឋាភិបាលដែលពា ក់ពិន្ទុនិងគម្រោងវ្លុំបា ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានតាមវិស័យក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីរួម ចំណែកដល់លទ្ធផលទី១ និងទី២ នៃការពង្រឹងប្រព័ន្ធ។ ខណៈពេលដែលប្រាក់ជំនួយនៃគម្រោងគំនិតផ្តួចផ្តើមនិងផលប៉ះពាល់ (II Grant) ចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាមួយចំនួននៃបច្ចេកវិទ្យាធន់នឹងអាកាសធាតុនិងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែ ប្រួលអាកាសធាតុ មូលនិធិគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយអាចលើកកម្ពស់ការសាកល្បងជាក់ស្តែង និងការសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យា និងកែលម្អការបន្សុំរបស់គម្រោងវ្លុំបា។

ការងារទឹកស្អាត និងអនាម័យប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

- បង្កើនខ្លឹមសារអំពីទឹកស្អាតនិងអនាម័យ និងសុខភាពដែលបានផ្តល់តាមខ្នងផ្ទះ រួមមានការចម្លងរោគ ជំងឺទាក់ទងនឹងទឹក ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទន្លេខ្សោយ កង្វះខាត និងហានិភ័យទាក់ទងនឹងគ្រោះទឹកជំនន់/គ្រោះរាំងស្ងួត។
- បន្តផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យ សុខភាព និងអនាម័យខ្លួនប្រាណ ទោះបីក្រសួងបានសាងសង់បង្គន់អនាម័យ ឬក៏ភ្ជាប់ទឹកទុយោរួចហើយ ក៏ដោយ។
- ផ្តល់ការអប់រំតាមវិធីសាស្ត្រដែលបានដៅទុកដើម្បីធានាថា ស្ត្រីអាចទទួលបានព័ត៌មានទាំងនេះ:
 ឧទាហរណ៍មិនមែននៅពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើកិច្ចការផ្ទះនោះទេ ព័ត៌មានស្តីពីការអនុវត្ត អនាម័យខ្លួនប្រាណវាមិនដូចគ្នាទៅនឹងព័ត៌មានស្តីពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ផ្ទះចម្រោះទឹក ឬការធ្វើតេស្តទឹកទេ ដូច្នេះគួរតែបានផ្តល់ជូនដោយឡែកពីគ្នា។
 កំណត់បណ្តាញទំនាក់ទំនងដែលស្រ្តីជឿទុកចិត្ត ឬជាផ្នែកមួយនៃការផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់ គ.ក.ន.ក និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាស្ត្រី។
- បញ្ចូលមតិគ្រឿងប្រដាប់របស់អ្នកទទួលបានផលអំពីគុណភាពសេវាកម្ម ផលិតផល និងបទពិសោធន៍របស់គម្រោងរ៉ូបា ក្នុងការស្នងមតិផ្ទៀងផ្ទាត់ និងប្រើប្រាស់មតិគ្រឿងប្រដាប់របស់ពួកគេដើម្បីកែលម្អនិងសម្របសម្រួលដំណើរការអនុវត្ត។

សមភាពយេនឌ័រនិងការផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រី

- បន្តជាមួយកូតាសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និង គ.ក.ន.ក ហើយមើលឱ្យបានឆ្ងាយលើសពីចំនួនស្ត្រីនៅក្នុង គណៈកម្មាធិការ និងតួនាទីរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងយល់ដឹងពីវិសាលភាពដែលពួកគេមានសំលេងនៅក្នុងការ សម្រេចចិត្ត និងលទ្ធផលរបស់គណៈកម្មាធិការ។ ប្រការនេះគួរតែជាផ្នែកមួយនៃក្របខ័ណ្ឌត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការ លោកខាងលិចជួបខាងកើត ហើយរួមបញ្ចូលទាំងសូចនាកររបបបរិមាណ និងគុណភាព។
- រួមបញ្ចូល គ.ក.ន.ក នៅក្នុងការរៀបចំ ដំណើរការ និងមតិយោបល់នៅដំណាក់កាលនីមួយៗនៃដំណើរការរបស់គម្រោងរ៉ូបា ឧទាហរណ៍នៅពេលធ្វើទិន្នន័យដើមគ្រា នៅពេលចលនាសហគមន៍ នៅពេលផ្ទៀងផ្ទាត់បង្គន់។ល។
- កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការទ្រទ្រង់ដែលមានស្រាប់សម្រាប់ការផ្តល់អំណាចយេនឌ័រ នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ដែលគម្រោងរ៉ូបាពង្រីក និងសម្របសម្រួលការពិភាក្សាដែលមានទាំងបុរសនិងស្ត្រីអំពីបទដ្ឋានយេនឌ័រ កត្តារាំងស្ទះ និងគុណប្រយោជន៍ ចំពោះការចូលរួមរបស់ គ.ក.ន.ក និង អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាស្ត្រី មុននិងអន្តរាគមន៍ពេលសកម្មភាពនៃរ៉ូបា។
- ផ្តល់ជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់ដៃគូ គ.ក.ន.ក និងប្រតិបត្តិករទឹកជាស្ត្រី ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរួមគ្នានិងគាំទ្រនិរន្តរភាពនៃសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុង ការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យ។
- រក្សាកម្រិតនៃការបណ្តុះបណ្តាលដែលបានផ្តល់ទៅ គ.ក.ន.ក និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាស្ត្រី ហើយធ្វើឱ្យប្រាកដថា វាមិនមែនបន្ថែមលើការងារដែលមិនទទួលបានកម្រៃនោះទេ ហើយក៏អាចរាប់បញ្ចូលជាការទទួលបាននូវជំនាញជាច្រើនដែលលើសពីការងារទឹកស្អាតនិង អនាម័យ ដូចជាជំនាញអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងជម្លោះ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការគ្រប់គ្រងគម្រោង។
- ផ្តល់លទ្ធភាពដើម្បីធ្វើបណ្តាញទំនាក់ទំនង ឬបង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនង ប្រសិនបើមិនមានសម្រាប់ គ.ក.ន.ក ប្រតិបត្តិករវិស័យឯកជនជាស្ត្រី និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាស្ត្រី ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ និងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេដឹង និងជាផ្នែកមួយនៃជំហានផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងខ្សែច្រវាក់តម្លៃសេវាកម្មរបស់ការងារទឹកស្អាតនិង អនាម័យ។
- គ្រប់សកម្មភាពកសាងសមត្ថភាពទាំងអស់ គួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃជាផ្នែកមួយនៃក្របខ័ណ្ឌត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការលោកខាងលិចជួប ខាងកើត និងរួមបញ្ចូលទាំងសូចនាកររបបបរិមាណនិងគុណភាពសម្រាប់ការវិភាគលើចំណេះដឹង ជំនាញ ឥរិយាបថ

និងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរ។ លទ្ធផលគួរតែត្រូវបានប្រាស្រ័យទាក់ទងទៅ គ.ក.ន.ក វិញ ជាមួយសកម្មភាពតាមដានមួយចំនួន។

ការចែករំលែកចំណេះដឹង

- បង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅសិក្សា និងអត្ថបទសង្ខេបអំពីគោលនយោបាយជាភាសាអង់គ្លេស និងខ្មែរ ពីការសិក្សាផ្សេងៗដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការលោកខាងលិចជួបខាងកើត (រួមទាំងរបាយការណ៍នេះ) របាយការណ៍របស់សមាគមទឹកស្អាតកម្ពុជា អង្គការជនពិការកម្ពុជា ទៅកាន់ដៃគូ និងភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់គម្រោងរ៉ូបា និងក្រុមការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យ ក្រុមការងារអនាម័យជនបទ និងបណ្តាញទឹកស្អាតនិងអនាម័យនានា។
- បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលចំណេះដឹងតាមអ៊ិនធឺណេតដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ព័ត៌មាននិងធនធានដែលប្រមូលបានពីគម្រោងរ៉ូបាជាមួយដៃគូរបស់គម្រោងរ៉ូបា និងបណ្តាញទឹកស្អាតនិងអនាម័យនានា នៅប្រទេសកម្ពុជា និងទូទាំងពិភពលោក។
- តាមដានជាមួយដៃគូតាមរយៈការប្រជុំ ឬការស្តង់មតិជាប្រចាំដើម្បីវាយតម្លៃថាតើពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់ផលិតផលចំណេះដឹងទាំងនេះ និងមានការផ្លាស់ប្តូរអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់ផលិតផលចំណេះដឹងទាំងនេះ។ ឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយ គឺការប្រើប្រាស់កំនូសប្លង់បង្កន់អនាម័យមានល្អឆ្លាស់ពីរជ្ជវ និងព័ត៌មានបច្ចេកទេស។

